

桂川・支川対策特別委員会

日 時 令和元年6月27日（木）午後1時30分～
場 所 第3委員会室

1 開 議

2 案 件

- ・河川改修の状況と今年度の計画について
（まちづくり推進部説明）
- ・現地視察（曾我部町、東本梅町）

3 その他

桂川・支川対策特別委員会

令和元年6月27日(木)

午後1時30分～

まちづくり推進部 桂川・道路整備課

桂川の改修事業について

1 桂川改修の概要について

(1) 治水対策の基本方針

- ① 日吉ダムの完成により、洪水調節を行い下流への流出量を調節する。
- ② 河道の河積拡大等により疎通能力の向上を図る。

(2) 日吉ダム(独立行政法人 水資源機構)

平成10年4月1日より管理を開始している。

(3) 河道改修

①国土交通省管理区間(嵐山より下流)

- ・平成21年3月に策定した淀川水系河川整備計画に基づき、戦後最大洪水(S28T13)を安全に流下させることを目指して、今後概ね30年間で河川整備を順次進めていくこととし、大下津地区、嵐山地区等で事業実施されていたところ、平成25年台風18号により、嵐山地区、久我地区で浸水被害が発生。
- ・このため、平成26年度から概ね5年間の緊急治水対策として、久我地区の河道掘削、大下津地区の引堤事業、嵐山地区での堆積土砂撤去や6号井堰の撤去等をスピードアップして進められている。
- ・嵐山地区では、緊急治水対策のうち、まず緊急的に堆積土砂撤去に着手し平成27年度までに完了、引き続き平成28年度から6号井堰の撤去に着手し平成29年度に完了、今年度中に左岸溢水対策が実施される予定。
- ・緊急治水対策の実施とともに、昨年12月に開催された第8回桂川嵐山地区検討委員会では、嵐山地区改修の今後の方向性といたしまして、可動式止水壁による左岸の溢水対策、一の井堰の改築、嵐山公園西側の派川改修の3点の治水対策が決定され、今後、国、府、京都市が連携して調査、設計等を進めることとされたところ。

②京都府管理区間(亀岡工区)等

- ・保津峡入口から旧保津橋までの保津工区については、日吉ダムの洪水調節とあわせて、当面計画(昭和57年出水対応(概ね1/10確率))に基づく河道改修を促進し、平成21年度に概成した。
- ・当面計画に引き続き平成22年からは、治水安全度の着実な向上を図るため、第1ステップとして堤防の嵩上げと高水敷の掘削を行い平成29年6月末には高水敷掘削が完了した。
- ・平成30年度は、護岸整備を実施していくとともに、平成30年8月に策定した桂川

上流圏域河川整備計画に基づき、第2ステップ計画実施に向けた検討を行った。

- ・令和元年度は、計画を更に進めるとともに、下流の国土交通省の整備時期に合わせた整備を実施するための準備を行う。
- ・なお、桂川支川の雑水川、千々川、七谷川等においても、河川改修事業を実施していく。

③保津川かわまちづくり計画

- ・人々の暮らしと深く関わり続けてきた保津川の歴史や文化を踏まえながら、河道改修に伴い新しく生まれた広大な河川空間を有効に利活用していくため、平成22年度に川をいかしたまちづくり、まちをいかした川づくりとして「保津川かわまちづくり計画」を策定。
- ・平成23年度には、保津川かわまちづくりに関係する様々な主体に参加いただき「保津川かわまちづくり推進協議会」を設置。
- ・この協議会では、実施主体や整備手法などを協議・調整する場として更に5つのWGを設置し、亀岡市と連携して年谷川の「野橋立」の復元、遊船乗り場の「さくら広場」整備などその実現に取り組んできたところである。また、平成30年度末には桂川左岸エリアの施設が完成し、包括占用の許可を受けた亀岡市が今後の利用方法等をWGで検討しているところである。

2 保津工区における主な経過

昭和62年9月	保津橋下流工区改修計画案を公表
昭和63年8月 ～平成元年1月	保津橋下流工区各地域(延長2.3km 保津町、亀岡地区、篠町)の同意を得て、現地の測量を実施
平成2年度	3段階(当面計画、暫定計画、基本計画)の実実施計画を策定
平成3～4年度	保津町、亀岡地区、篠町に計画幅を示す目安杭を設置
平成5年度	当面計画の第1段階の進め方(第1期整備計画)について関係地域、地権者及び関係機関に説明を実施
平成6～7年度	第1期整備計画の用地測量(篠町山本、保津町八ノ坪・閑谷)の実施
平成8年度	第1期整備計画の用地取得に着手
平成9年度	第1期整備計画の本工事に着手(鶉の川床止工の施工) 保津橋架け替え工事に着手
平成10年度	第1期整備計画の築堤工事に着手 第2期整備計画の地権者調査に着手(保津町[桂川右岸]地区、西川、年谷川、雑水川地区)
平成11年度	第2期整備計画の用地測量に着手
平成12年度	第2期整備計画の用地取得に着手 第1期整備計画の築堤工事完了
平成13年度	保津橋架け替え完了 第2期整備計画の築堤工事に着手
平成14年度	下河原樋門等の重要構造物工事に着手
平成15年度	国の短期集中型事業として緊急対策特定区間の設定を受ける 第1期整備計画の用地取得完了
平成16年度	保津橋下流～雑水川間の桂川本川築堤工事に着手 雑水川に架かる市道橋の架け替えに着手

	鵜の川（高橋下流）の築堤が概成
平成 17 年度	支川西川の築堤工事に着手 雑水川に架かる市道橋の架け替え完了 年谷川に架かる葛原橋、西川に架かる下流農道橋の架け替えに着手 雑水川、千々川に架かる J R 橋梁の架け替えに着手
平成 18 年度	桂川本川高水敷の掘削工事に着手 西川に架かる上流農道橋に着手 桑の木樋門、向嶋樋門、準用河川東川樋門に着手
平成 19 年度	桂川本川高水敷の掘削工事を実施 雑水川に架かる農道橋に着手。雑水川取水堰の改築完了 八ノ坪樋門、六ノ坪樋門、葛原樋門に着手
平成 20 年度	本川・支川の築堤工事促進 雑水川に架かる農道橋の架け替え完了。西川取水堰の改築 山本樋門、下江村樋門に着手 雑水川、千々川に架かる J R 橋梁の架け替え完了
平成 21 年度	本川・支川の築堤・護岸工事促進 「当面計画」に基づく河道改修の概成
平成 22 年度	桂川本川と西川、年谷川の合流部工事着手 保津川遊船前護岸工事着手 「保津川かわまちづくり計画」策定 保津橋下流左岸「花回廊」の一部完成
平成 23 年度	桂川本川と西川、年谷川の合流部工事完成 保津川遊船前護岸工事促進 桂川本川高水敷掘削 「保津川かわまちづくり推進協議会」設置 雑水川合流部桂川本川下流右岸「花回廊」の一部着手 年谷川下流左岸「野橋立」の一部着手
平成 24 年度	桂川本川高水敷掘削工事促進 保津川遊船前護岸工事促進 雑水川合流点工事完成 年谷川右岸の「野橋立」の完成


	桂川左岸堤防天端の園路整備着手 桂川右岸水際再生工事の一部着手
平成 2 5 年度	桂川本川高水敷掘削工事促進 保津川遊船前護岸工事促進 保津川遊船付近堤防天端さくら広場工事着手 桂川右岸堤防の花回廊整備工事着手 桂川右岸山本浜の護岸（根固）工事着手
平成 2 6 年度	桂川本川高水敷掘削工事促進 保津川遊船付近堤防天端さくら広場工事完成 桂川右岸堤防の花回廊整備工事促進 桂川右岸山本浜の護岸（根固）工事促進
平成 2 7 年度	桂川本川高水敷掘削工事促進 保津川遊船前護岸工事概成 桂川右岸堤防の花回廊整備工事促進 桂川左岸多目的広場完成
平成 2 8 年度	桂川本川高水敷掘削工事促進
平成 2 9 年度	桂川本川高水敷掘削工事促進（6月完了） 護岸工事促進
平成 3 0 年度	桂川上流圏域河川整備計画策定（8月） 護岸工事促進 桂川左岸じゃこ田・湿地エリア周辺施設完成
令和元年度 （平成 3 1 年度）	護岸工事促進 築堤工事

3 平成30年度及び令和元年度事業（予定）について

河川名	工区名		平成30年度	令和元年度（予定）
桂川	保津 (旧保津橋く保津峽入り口)	太田 鶴の川 下河原 西川 蓼島 年谷川 葛原 雑水川 下中島 閑谷 八ノ坪	護岸工事 ほか	護岸工事、 詳細設計、 土質調査、 用地補償 築堤工事 ほか
		曾我谷川		浚渫
		宇津根		
		大井	堤防調査、浚渫	堤防調査、設計、浚渫
		千々川	橋梁、護岸工事	橋梁、護岸工事
		千代川		
		愛宕谷川		
		七谷川	詳細設計、環境調査、 護岸工事、掘削工事	詳細設計、環境調査 サイフォン工事、 掘削工事
		河原林	護岸復旧	
		馬路		
	雑水川 (JR～極楽橋)	橋梁設計、 橋梁・護岸工事	橋梁設計、用地補償 橋梁・護岸工事	
	犬飼川 (桂川～山内川合流)	若宮橋架替 (改築負担金)	若宮橋架替 (改築負担金)	
	千々川 (国道9号～京都縦貫道)			

注： は、桂川の支川処理区間

桂川上流圏域の段階整備イメージ

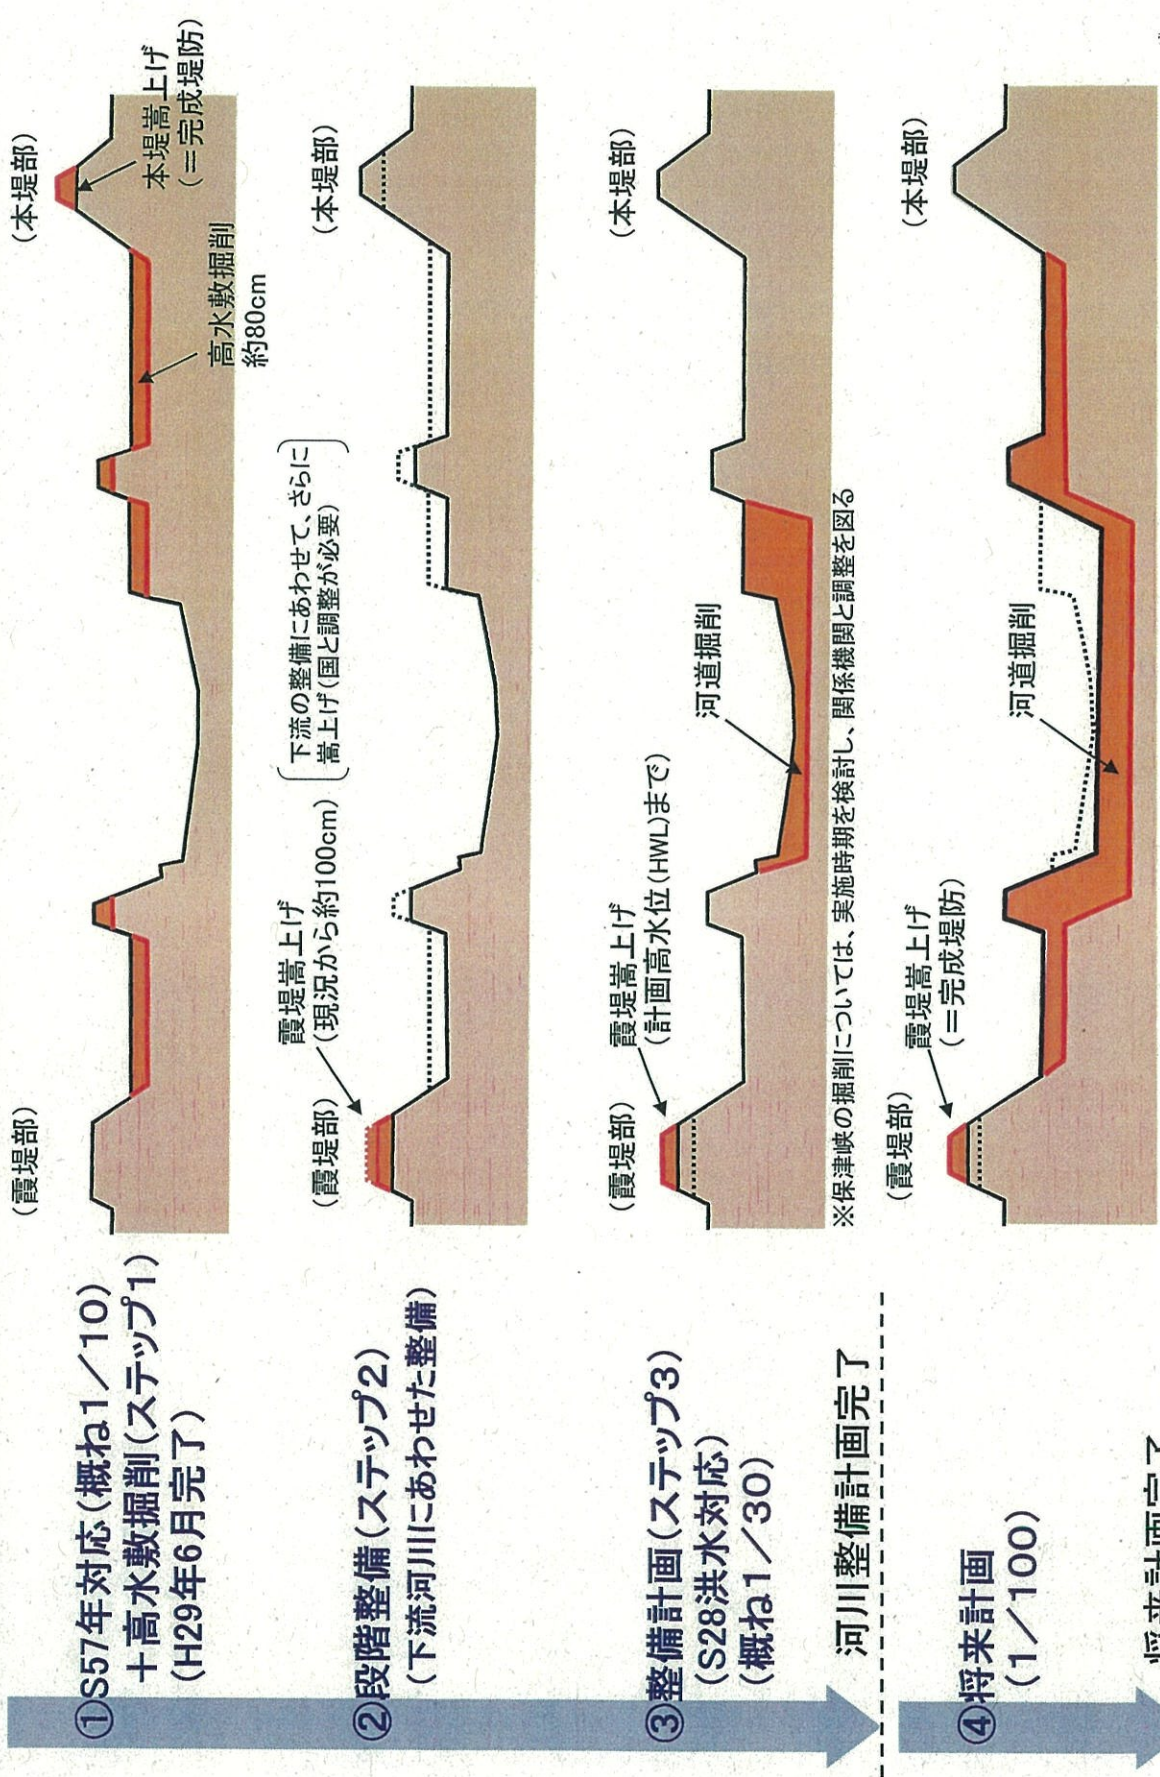

①S57年対応(概ね1/10)
+高水敷掘削(ステップ1)
(H29年6月完了)

②段階整備(ステップ2)
(下流河川にあわせた整備)

③整備計画(ステップ3)
(S28洪水対応)
(概ね1/30)

河川整備計画完了

④将来計画
(1/100)

将来計画完了
