

令和4年度 第1回育親中学校ブロック協議会

～育親中学校ブロックにおける義務教育学校の開校に向けて～

令和4年4月20日（水）午後7時30分～ 育親中学校 1階 視聴覚室


目次

- 1 仮開校案
- 2 開校に向けた調整事項案
- 3 タイムスケジュール案
- 4 直近半年のスケジュール案

1-1 仮開校案

- 本梅小学校に仮校舎を設置し、義務教育学校を開校（仮開校）
 - 令和6年4月仮開校
 - 前期課程（小学生） 既存の本梅小学校校舎を利用
 - 後期課程（中学生） 仮校舎を利用
- 仮開校中に育親中学校の場所に新たな施設を設置し、完成後、新校舎での学習を開始
 - 令和8年3月新校舎完成（育親中学校を新設or改修）
 - 令和8年度 新校舎での学習を開始

1-2 仮開校案

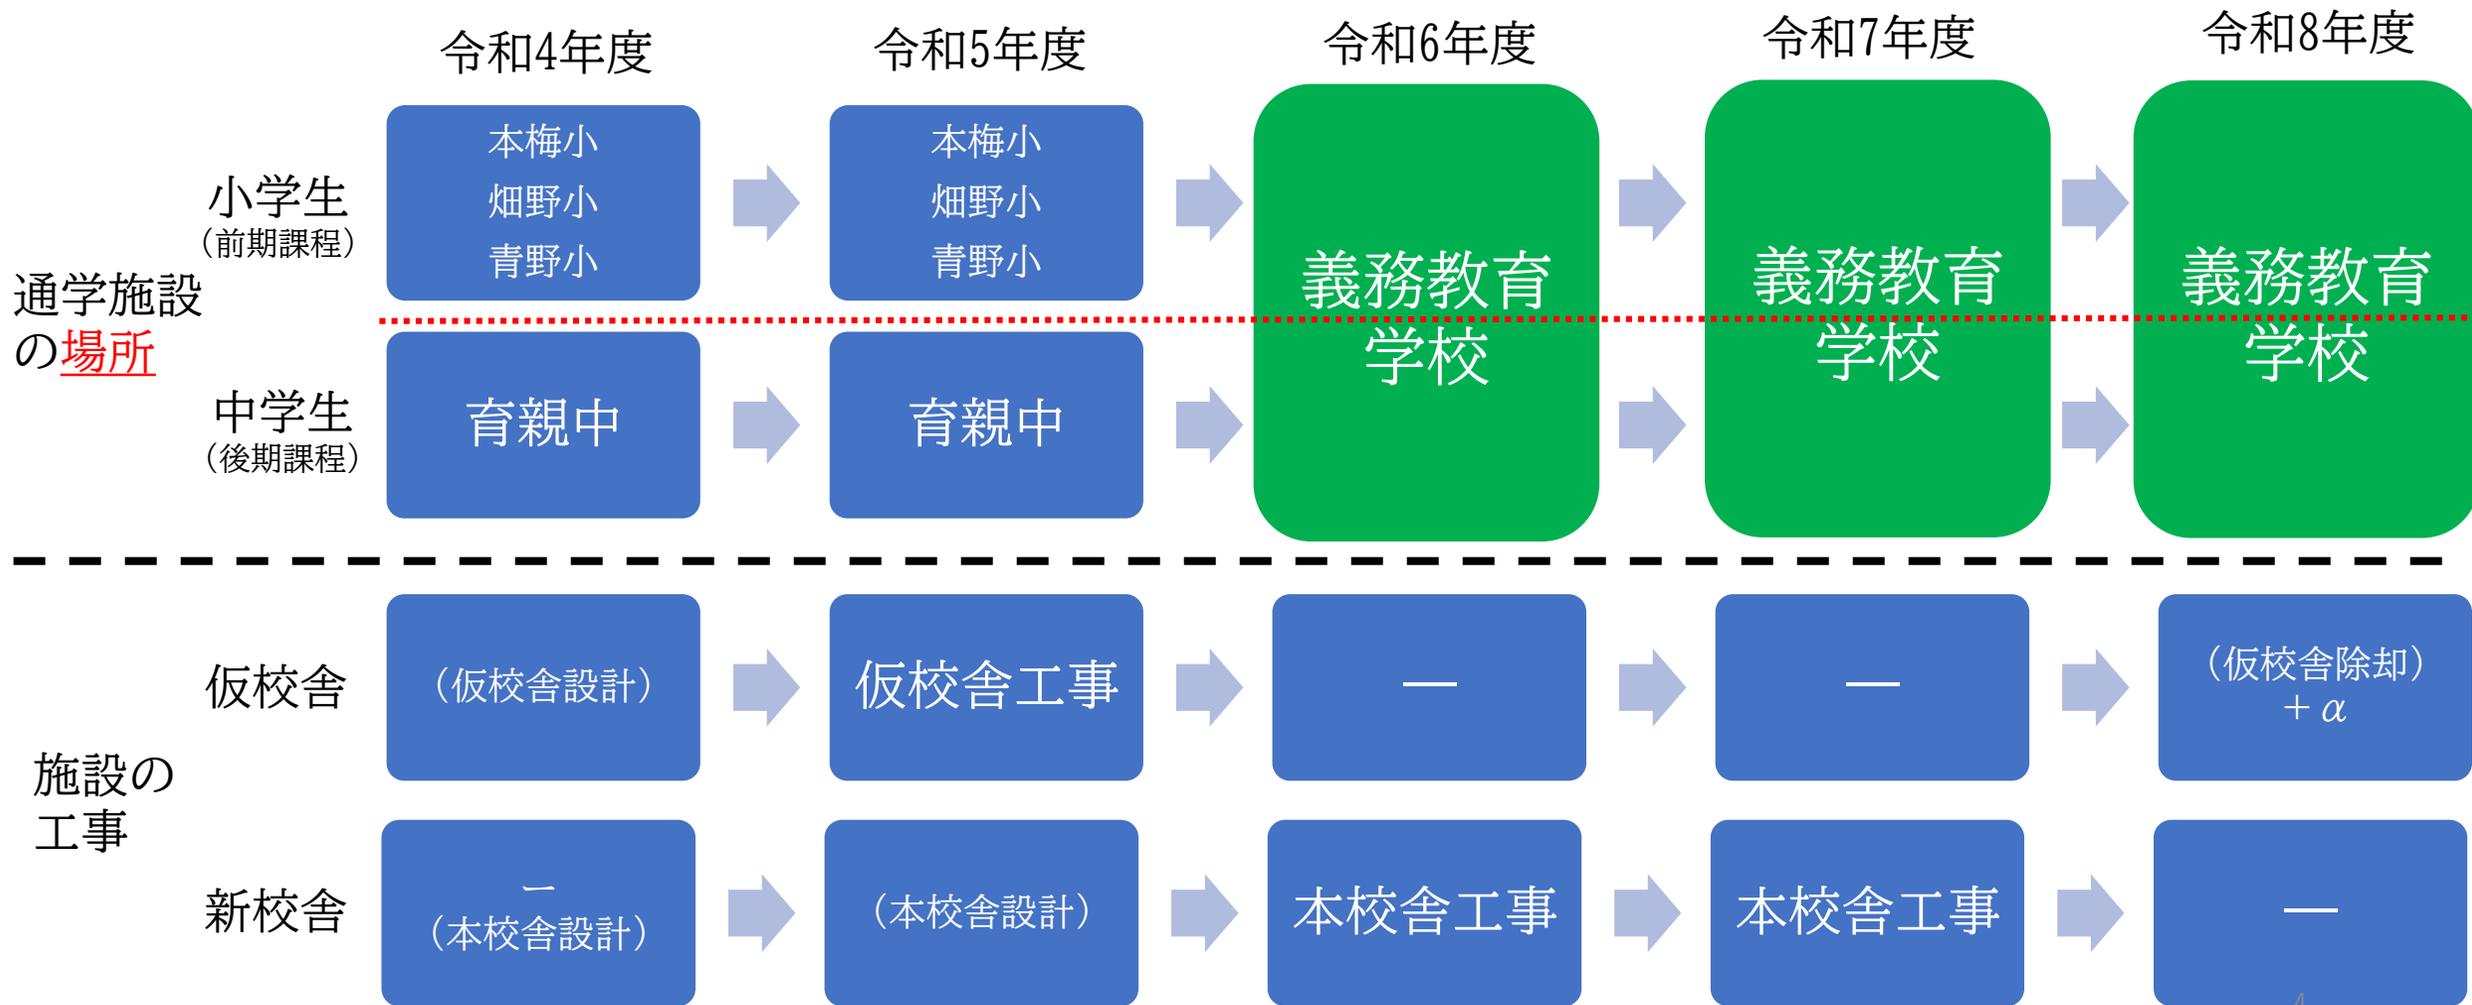

2-1 開校に向けた調整事項案

- 基本事項に関すること
新学校の名称、校章、校歌、コンセプト、式典行事、制服・体操服 など
- 教育に関すること
教育課程・教育内容（日課・時定表、年間行事予定、年間指導計画、教材・教具、校内研修、評価基準、地域行事、学校独自の教育活動、生徒会組織、校則）に関すること、児童会・生徒会に関すること、事前交流、年間行事の調整、部活動、教職員交流 など
- PTAに関すること
PTA組織・規約の改編に関すること、役員選出など運営に関すること、役員引き継ぎ、PTA行事 など
- 通学に関すること
スクールバス運行ルート（通常の登下校、遅刻・早退の場合、部活動など）、バス乗降場所、バス運行体制、通学路、通学安全対策 など
- 児童生徒・保護者・地域住民に関すること
児童生徒の健康・心のケア、保護者・住民説明会、地域行事 など
- 学校事務に関すること
備品の整理・移動に関すること、文書整理・引継、公金の管理、予算計画 など
- 施設に関すること
校舎工事に係る設計、校舎工事、除却、跡地利用 など

2-2 開校に向けた調整事項案

関係組織

◎：主となる組織 ○：特に調整を要する組織 ●：関係する組織

	学校	PTA	地域	教育委員会事務局
基本事項に関すること	○	●	◎	○
教育に関すること	◎	○	●	○
PTAに関すること	○	◎	●	○
通学に関すること	○	○	●	◎
児童生徒・保護者・地域住民に関すること	◎	◎	◎	◎
学校事務に関すること	◎			○
施設に関すること	○	●	●	◎

2-3 開校に向けた調整事項案

育親中学校ブロック義務教育学校開校に向けた調整会議

新学校コンセプト検討グループ

- ・新学校の名称候補やコンセプトなどを検討するグループ
- ・主に基本事項に関すること、児童生徒・保護者・地域住民に関することを検討

教育・学習環境検討グループ

- ・PTAに関することや特色ある教育内容などを検討するグループ
- ・主に教育に関すること、PTAに関することを検討

通学・施設検討グループ

- ・通学に関することや工事時の安全対策などを検討するグループ
- ・主に通学に関すること、施設に関することを検討

※学校事務に関することは、学校及び教育委員会の事務的内容なので省略

2-4 開校に向けた調整事項案

育親中学校ブロック義務教育学校開校に向けた調整会議

新学校コンセプト
検討グループ

- ・各学校職員 1名
- ・各学校PTA 1名
- ・各地域（町） 1～2名
- ・市教育委員会 1～2名

13～18名

教育・学習環境
検討グループ

- ・各学校職員 1～2名
- ・各学校PTA 1名
- ・各地域（町） 1名
- ・市教育委員会 1～2名

13～18名


通学・施設
検討グループ

- ・各学校職員 1名
- ・各学校PTA 1名
- ・各地域（町） 1名
- ・市教育委員会 1～2名

13～14名

合計 39～50名

検討結果
報告



確認

育親中学校
ブロック協議会

教育委員会

3-1 タイムスケジュール案

基本事項

年	令和4年									令和5年												令和6年			
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
スケジュール	校名候補選定			校章、校歌、制服・体操服等の検討									式典等の検討・準備												仮開校

3-2 タイムスケジュール案

PTA関係

年	令和4年									令和5年												令和6年			
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
スケジュール										新しいPTA組織・規約等の検討、引継															
										保護者交流会															

仮開校

3-3 タイムスケジュール案

学校関係


年	令和4年									令和5年												令和6年			
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
スケジュール					各校財産の整理					移動計画立案						備品・文書の整理・引継					引越		仮開校		
										学校運営、教育課程の検討															
										事前交流															
					在校生説明		新入生説明															新入生説明			
											教職員交流・教職員共同研修等														
														式典等の準備											

3-4 タイムスケジュール案

市教育委員会

年	令和4年									令和5年												令和6年			
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
スケジュール	仮校舎設計									仮校舎工事												引越	仮開校		
	本校舎検討						本校舎設計																		
	スクールバス・通学路の検討									運行体制・安全体制等の整備															
	跡地利用検討																								

4-1 直近半年のスケジュール案

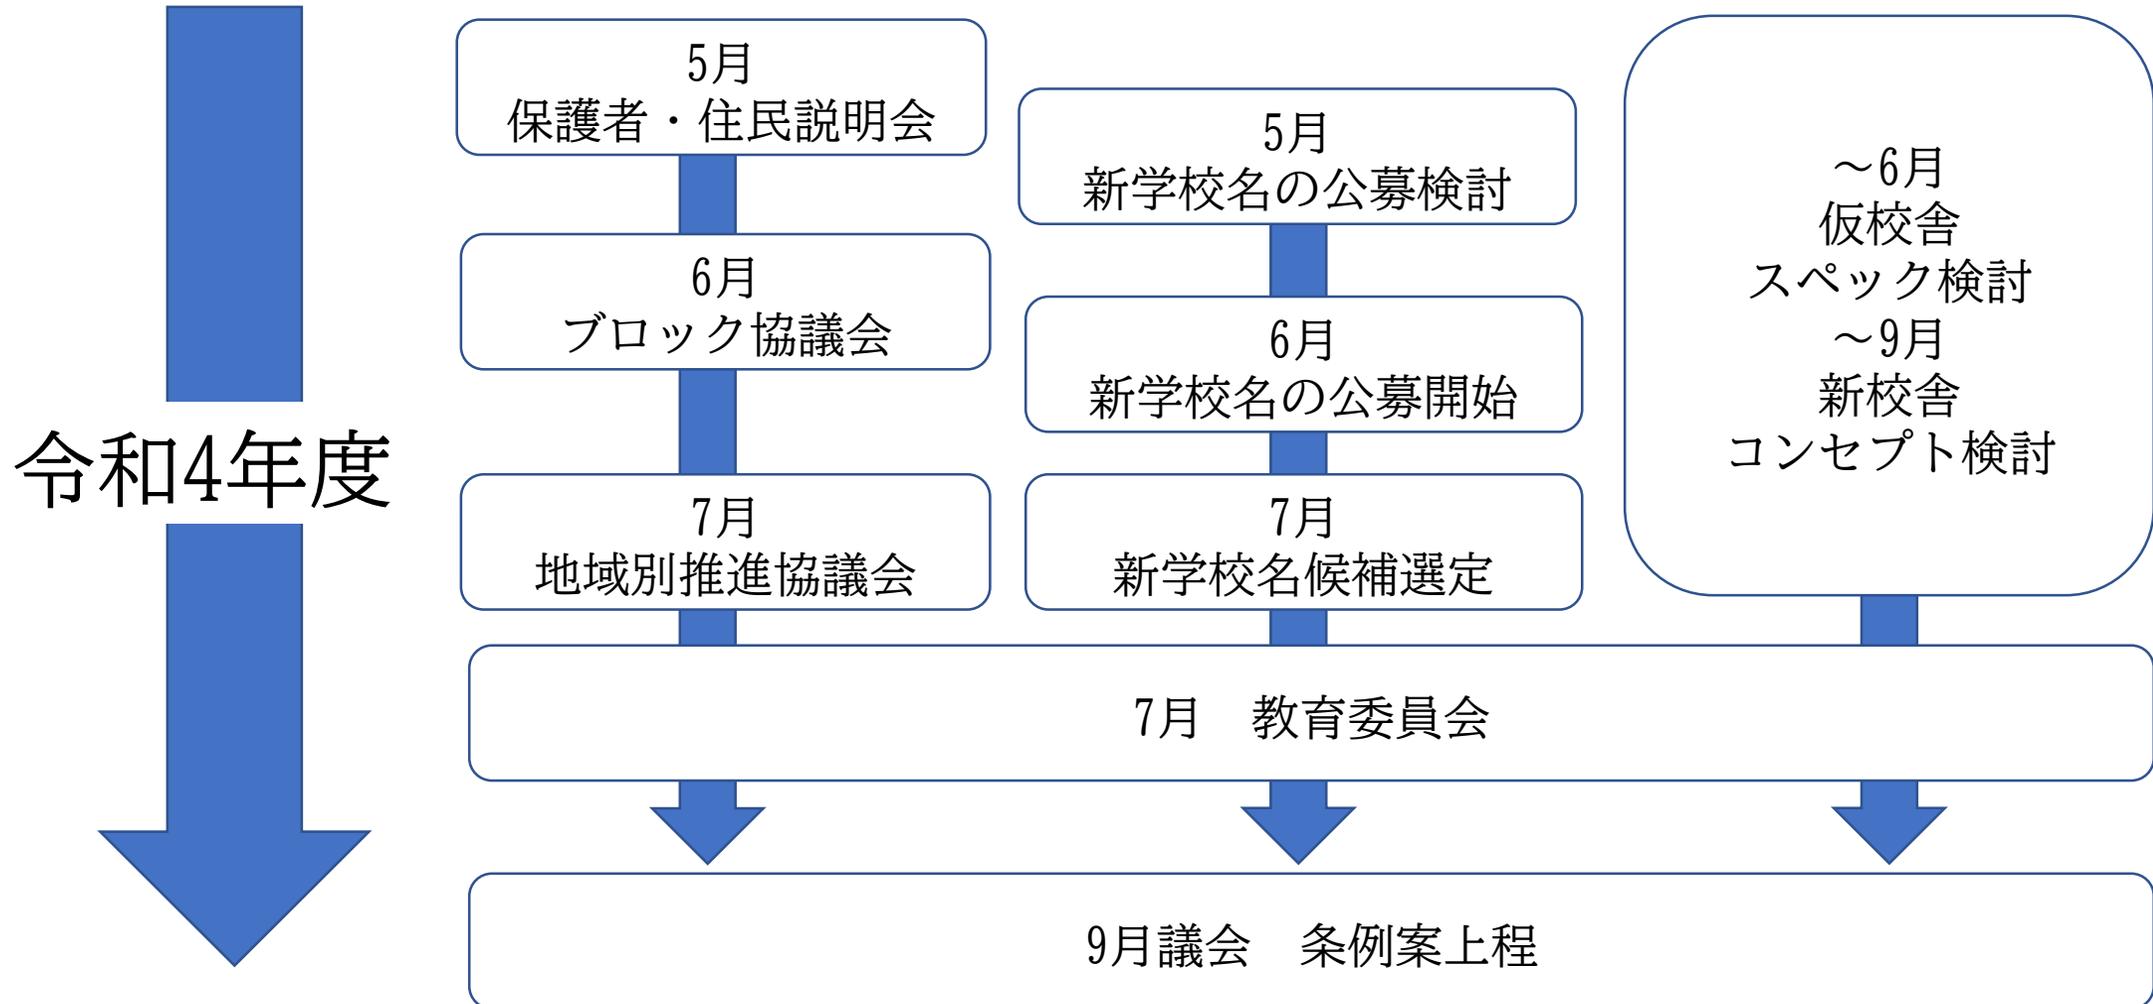

育親中学校ブロック 令和6年4月義務教育学校仮開校に向けたスケジュール案

年度 年 月	令和4年度												令和5年度												令和6年度					
	令和4年						令和5年						令和6年																	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～					
基本事項		校名候補選定					校章、校歌、制服・体操服等の検討						式典等の検討・準備																	
PTA関係							新しいPTA組織・規約等の検討、引継						保護者交流会						PTA新体制											
学校関係							学校運営、教育課程の検討						事前交流						開校 (仮開校)											
							在校生への説明	新入生説明																						
							各校財産の整理			移動計画立案			備品・文書の整理・引継			引越														
市教育委員会							スクールバス運行方法・通学路の検討			スクールバスの運行体制・通学路等の安全体制等の整備						バス運行														
							仮校舎設計			仮校舎工事						引越	本校舎工事													
							本校舎コンセプト検討			本校舎設計																				
							12月補正予算積算～議決			当初予算積算～議決						学校設置届出														
							9月補正予算積算～議決			当初予算積算～議決						当初予算積算～議決														
							保護者・住民説明会	ブロック協議会	地域別推進協議会	臨時教育委員会	全体進捗確認	ブロック協議会	保護者・住民説明会	全体進捗確認	ブロック協議会	保護者・住民説明会	全体進捗確認	ブロック協議会	保護者・住民説明会	全体進捗確認	ブロック協議会	入学通知	保護者・住民説明会	ブロック協議会						
							条例改正				入学通知																			
							跡地利用の計画																							
